Отчетный период: (июль 2022г ~ декабрь 2022г)

Номер проекта: 52042-001

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

GRANT 0683 – TAJ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОРИДОРЫ 2, 3 И 5 (ОБИГАРМ–НУРОБОД) ПРОЕКТ АВТОДОРОГИ

Подготовлен:

Dainichi Consultant Inc. (Япония) совместно с суб-консультантом ГУП “»Институт проектирования транспортных сооружений» (Таджикистан) для Министерства Транспорта Республики Таджикистан

DAINICHI CONSULTANT INC.

SUE "DITI"

ЯНВАРЬ 2023г

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОРИДОРЫ 2, 3 И 5 (ОБИГАРМ–НУРОБОД)
ПРОЕКТ АВТОДОРОГИ
Грант АБР 0683-TAJ

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА
Контракт КУП: ONRP/QCBS/CS-02

Настоящий полугодовой отчет о мониторинге социальных гарантий является документом заемщика. Мнения, выраженные в настоящем документе, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке какой-либо страновой программы или стратегии, финансировании какого-либо проекта или при указании или упоминании конкретной территории или географического района в настоящем документе Азиатский банк развития не намерен выносить никаких суждений относительно правового или иного статуса любой территории или местности.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр
Содержание…		*i*
Сокращения…		*iii*
Краткое обобщение…		*iv*
1.	ВВЕДЕНИЕ……	1
1.1	Предыстория проекта…….	1
1.2	Описание проекта…..……	2
2.	ОБЪЕМ И ЦЕЛИ ПОЛУГОДОВОГО ОТЧЕТА СОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ……...	4
2.1	Объем отчета……	4
2.2	Цель отчета……...	4
2.3	Методология подготовки отчета…….	4
3	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В ИЮНЕ - ДЕКАБРЕ 2022г…….	5
3.1	Общий статус проекта……...	5
3.2	Физический прогресс проекта……	5
4.	РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУГОДОВОГО МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ……	8
4.1	ПОЗП для основной дороги……...	8
4.2	Подъездные дороги к селам……...	8
4.3	Консультации и обзорные совещания……	9
4.4	Механизм рассмотрения жалоб…….	11
4.4.1	Мониторинг жалоб и статус их рассмотрения за отчетный период……...	11
4.4.1.1	Статус мониторинга жалоб……...	11
4.4.1.2	Статус рассмотрения жалоб……...	18
4.5	Реализация Гендерного плана действий……...	18
4.5.1	Мониторинг ГПД……	18
4.5.2	Деятельности реализации гендерных мероприятий……...	18
5.	ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ…… ……...	19
5.1	Записи несоблюдений и решения…….	19

Рисунки

Рис 1: Карта расположения проектной дороги……. 3

Рис 2: Расположения подъездных дорог к селам……. 8

Рис 3: Фотографии визитов и встреч в июле-декабре 2022г 9

Таблицы

Таблица 1: Основные проектные данные……... 1

Таблица 2: Объемы основных работ……... 2

Таблица 3: Физический прогресс проекта……... 5

Таблица 4: Ежемесячный план по сравнению с фактическим ходом проекта …… 7

Таблица 5: статус мониторинга жалоб…… 12

Приложения

Приложение 1: Записи жалоб……. 20

СОКРАЩЕНИЯ

АБР	:	Азиатский банк развития
ПЛ	:	Пострадавшее лицо
ЦАРЭС	:	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
КЛ	:	Контактное лицо
КНС	:	Консультант по надзору за строительством
ПЛ	:	Перемещенное лицо
ФГД	:	Обсуждение в фокус-группе
ГПД	:	Гендерный план действий
КРЖ	:	Комитет по рассмотрению жалоб
МРЖ	:	Механизм рассмотрения жалоб
ОЗП	:	Отвод земли и переселение
ПОЗП	:	План отвода земли и переселения
МТ	:	Министерство Транспорта
НПО	:	Неправительственная организация
ККП	:	Координационный комитет проекта
ПОВ	:	Предварительная оценка воздействия
ЦРП	:	Центр реализации проекта
ЦРП РД	:	Центр реализации проекта по реабилитации дорог:
КУП	:	Консультант по управлению проектом
ПО	:	Полоса отвода
ПЗМ	:	Заявление о политике защитных мер (АБР, 2009 г.)
ТЗ	:	Техническое задание

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ

1. Отчет

Настоящий документ является четвертым Полугодовым отчетом по мониторингу социальных гарантий Консультанта по управлению проектом (КУП) для проекта дороги Обигарм-Нуробод (Участок 1) в рамках Проекта дороги ЦАРЭС Коридоры 2, 3 и 5 (Обигарм-Нуробод) Правительство Таджикистана. Он охватывает отчетный период с июля 2022 года по декабрь 2022 года. В отчете подробно описывается ход выполнения мероприятий по социальным гарантиям, объясняется статус соответствия проекта, описывается статус жалоб и другие результаты мониторинга вопросов, связанных с социальными гарантиями, связанных с проектом.

2. Введение в проект

Проект автодороги Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), коридоры 2, 3 и 5 (Обигарм-Нуробод) (Проект), финансируемый Азиатским банком развития (АБР), начался в июне 2021 года с целью завершить работы к сентябрю 2024г. Министерство транспорта (МТ) Республики Таджикистан реализует Проект через свой Центр реализации проекта по реабилитации дорог (ЦРП РД) при поддержке КУП. КУП обеспечивает координацию и поддержку части проекта (участок 1), которая охватывает 30,217 км, включая 6 мостов, 2 туннеля длиной 1,61 км и 1,70 км и около 30 км подъездных дорог к селам.

3. Описание проекта

Дорога Проекта разделена на три участка: (i) Участок 1: Участок Обигарм-Тагикамар протяженностью около 30 км, включая 2 туннеля длиной 1,6 км и 1,7 км; (ii) Участок 2: Тагикамар-Нуробад протяженностью около 44 км, включая 1 туннель 2,6 км и 1 длинный временный мост; и (iii) Участок 3: Мост длиной около 760 м и подходы к нему.

Участок 1 проекта также включает реабилитацию 11 подъездных дорог к селам общей протяженностью около 30 км, чтобы облегчить доступ населения к проектной дороге автомагистрали М 41.

4. Подготовка отчета и методология

План отвода земли и переселения (ПОЗП) для Проекта требует внутреннего мониторинга, поскольку Проект был отнесен к категории «В» в соответствии с защитной политикой АБР в отношении вынужденного переселения, поскольку он не вызывает значительного вынужденного переселения. Поэтому ПОЗП предложил ЦРП РД провести внутренний мониторинг реализации ПОЗП при содействии специалистов по переселению КУП. Таким образом, составление этого полугодового отчета по мониторингу социальных гарантий было выполнено в соответствии с механизмом внутреннего мониторинга, изложенным в ПОЗП. Методология, принятая для подготовки настоящего Отчета, включает рассмотрение соответствующих ежемесячных отчетов о ходе работ КУП и Консультанта по строительному надзору (КНС) и других доступных документов. Необходимые данные для отчета также были собраны в ходе посещений объектов, консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами и подрядчиком.

5. Воздействие ОЗП и ПОЗП проекта

Производство физических работ на участке 1 дороги Обигарм-Тагикамар потребовало приобретения земли и других активов, что вызвало воздействие отвода земли и переселения (ОЗП). Для устранения воздействия ОЗП в августе 2019 года был подготовлен ПОЗП для дороги Обигарм-Тагикамар (Участок 1). В этом ПОЗП проект был отнесен к категории В по принудительному переселению в соответствии с ППЗМ АБР - 2009. Этот ПОЗП был реализован МТ в течение 2019 года. 2020 г., и доступ к полосе отчуждения главной дороги был официально предоставлен Подрядчику 18 июня 2021 г. после рассмотрения и принятия АБР отчета о соблюдении ПОЗП.

6. Социальные гарантии и гендерный мониторинг

Как отмечалось выше, ПОЗП для Главной трассы был подготовлен в августе 2019 года и реализован МТ в течение 2019/2020 гг. Отчет о соблюдении ПОЗП был подготовлен в августе 2020 года ЦРП РД, подтверждая, что реализация ПОЗП была удовлетворительной и успешной, и Проект соответствовал принципам безопасности, изложенным в ППЗМ АБР 2009, в соответствии с национальными законами и правилами.

Проект включает реабилитацию 11 подъездных дорог к селам общей протяженностью около 30 км. Выполненные проекты этих подъездных дорог подлежат рассмотрению сторонами, чтобы свести к минимуму или полностью избежать необходимости в дополнительной земле, следовательно, ПОЗП. Определение и маркировка полосы отвода должны выполняться КНС и Подрядчиком по согласованию с КУП для подтверждения необходимости в дополнительной земле. Затем, после этого, команда КУП подтвердит необходимость ПОЗП или необходимость отчета о социальной осмотрительности (ОСО) в случае отсутствия воздействия. Окончательный отчет, в зависимости от обстоятельств, планируется завершить к июню 2023 года. Строительство подъездных дорог к селам планируется начать в июле 2023 года. Подъездные дороги к селам будут осуществляться по имеющейся ширине дорог. Это потребует подготовки ОСО для подъездных дорог к селам в качестве альтернативы ОЗП. Для выполнения этой задачи специалисты КУП по переселению будут помогать ЦРП РД с целью сдачи ОСО к середине июня 2023 года.

Проект включает реабилитацию 11 подъездных дорог к селам общей протяженностью около 30 км. Сделанные проекты этих подъездных дорог подлежат рассмотрению сторонами, чтобы свести к минимуму или полностью избежать необходимости в дополнительной земле, следовательно, ПОЗП. Были проведены консультации с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов, возникающих в ходе реализации проекта, и, следовательно, для рекомендации путей продвижения вперед. Практика проведения официальных собраний сообщества была изменена по причине неудобства для жителей деревни и экономии их времени на дорогу. МРЖ, созданный для регистрации жалоб, должным образом уведомил жителей села вдоль проектного коридора. Было несколько незначительных недовольств и жалоб от сообществ, которые, как сообщается, полностью урегулированы к полному удовлетворению заявителя. Всего за отчетный период с июля по декабрь 2022 г. через КРЖ было подано 9 жалоб; 1 в июле 2022 г., 4 в августе 2022 г., 2 в сентябре 2022 г., ни одного в октябре 2022 г., 2 в ноябре 2022 г. и ни одной в декабре. 2022. Все эти жалобы были рассмотрены и разрешены к полному удовлетворению пострадавшего лица. Помимо этих 9 разрешенных жалоб, на конец отчетного периода не было нерешенных жалоб.

В течение отчетного периода специалист КУП по гендерным вопросам выезжал на места с целью проведения обсуждений в фокус-группах. Специалист также посетил

объекты, чтобы помочь Заказчику определить подходящие места для размещения торговых точек, предусмотренных для проектной территории. К этим визитам присоединились представители различных джамоатов, в том числе председатель джамоата Обигарм Мусозода З. для выбора мест для установки рынков вдоль проектного коридора. Рынки направлены на улучшение экономической ситуации в населенных пунктах, так как в настоящее время там нет магазинов и жители вынуждены ездить в Обигарм для своих повседневных нужд. Отчет был представлен в ЦРП РД в октябре 2022 года и подробно описан в настоящем отчете.

7. Запись о несоответствиях и решениях

Реализация ПОЗП для главной дороги (Обигарм-Тагикамар) была завершена, и в августе 2019 года ЦРП РД подготовил отчет о соответствии, подтверждающий, что реализация ПОЗП была удовлетворительной и успешной. Однако в ходе строительных работ были замечены некоторые дополнительные проблемы, связанные с землей и недвижимостью. КУП по указанию ЦРП РД провела полевые исследования в сентябре/октябре 2022 г., чтобы установить степень воздействия и потребность в дополнительных ОЗП.

Отчет о необходимости дополнения к ПОЗП был представлен в ЦРП РД вместе с методологией. ЦРП РД одобрил представленную методологию, см. письмо ЦРП РД №. 3/338 от 16.08.2022г и попросил КУП приступить к выполнению задачи. Консультации на уровне села проводятся с людьми, затронутыми проектом, и их сообществом, чтобы избежать и смягчить последствия непредвиденного отвода земли и переселения (ОЗП). Жалобы регистрируются в формах регистрации жалоб (ФРЖ), и ведется их реестр, в котором фиксируются решения по конкретным жалобам. КУП представила проект Дополнения в ЦРП РД 8 февраля 2023 г. под исх. № DCIHO-CAREC-09 BG/01/01-65 от 08.02.2023г. Подробные пояснения по выявленным проблемам, их причинам, методологиям и т. д. даны в представленном проекте Дополнения к ПОЗП.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предыстория проекта

1. Министерство транспорта (МТ) Республики Таджикистан (Правительство) через Группу реализации проектов по реабилитации дорог (ЦРП РД) реализует коридоры 2, 3 и 5 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) (Обигарм-Нуробод), проект автодороги (Проект) с июня 2021 года. Проект финансируется Азиатским банком развития (АБР) и поддерживается Консультантом по управлению проектом (КУП) по контракту на консультационные услуги ONRP/QCBS/CS-02.

2. КУП обеспечивает координацию и услуги по поддержке части проекта, которая охватывает 30,217 км, включая 6 мостов, 2 туннеля длиной 1,61 км и 1,70 км. Кроме того, Проектом предусмотрено восстановление и улучшение около 30 км существующих подъездных дорог к селам. Основные данные по проекту приведены в таблице 1, а объемы основных работ приведены в таблице 2.

Таблица 1: Основные данные проекта

Название проекта	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС) Коридор 2, 3 и 5 (Обигарм - Нуробод) проект автодороги
Заказчик (Исполнительное агентство)	Министерство транспорта Республики Таджикистан
Подрядчик	Компания Строительство дорог и мостов в провинции Хунань, Китай
Дата присуждения контракта	31 марта 2021 г.
Дата начала	18 июня 2021 г.
Контрактный период	1200 дней
Дата завершения контракта	17 октября 2024 г.
Консультант по надзору за строительством (КНС) (Инженер)	СП Temelsu LTD & CTI, Турция-Япония
Заключение контракта	30 ноября 2020г
Дата начала	09 апреля 2021г.
Контрактный период	Срок строительства 40 месяцев и устранение дефектов 9 месяцев
Дата завершения контракта КНС	09 августа 2024 г.
Консультант по управлению проектом (КУП)	Дайничи Инк., Япония
Дата присуждения контракта	15 апреля 2021 г.
Дата начала	01 июня 2021 г.
Контрактный период	40 месяцев
Дата завершения контракта	30 сентября 2024 г.

Таблица 2: Объем основных работ

№	Описание	Ед. изм	Количество	Примечания
1.	Засыпка грунтового основания	м3	1 250 000	Включая заднюю часть водопропускной трубы, заднюю часть подпорной стены, земляное полотно, участок моста, Сельские дороги
2.	Общие разработки	м3	1 980 000	В том числе дренаж, подпорная стена, земляные работы, участок моста, Сельские дороги
3.	Скальные разработки	м3	2 330 000	В том числе дренаж, подпорная стена, земляные работы, участок моста, Сельские дороги
4.	Большой и Средний мост	м/кол.	481/6	Магистральный мост
5.	11 подъездных дорог к селам	км	30.25	
6.	Водопропускная труба	кол.	73	
7.	Туннель (одно отверстие)	м/кол.	3312/2	Туннели Кандак, Карагач
8.	Бетонная подпорная стена	м3	77 200	Защитно-дренажные работы с основной трассой
9.	Габионная стена	м3	182 300	
10.	Асфальтовое покрытие	м3	17 549,60	
11.	Асфальтовая подложка	м3	21 146,22	
12.	Основание покрытия	м3	64 521,31	
13.	Подложка покрытия	м3	103 542,65	

1.2 Описание проекта

3. Проект в первую очередь касается строительства около 80 км дороги Обигарм-Нуробад в качестве инициативы по обходу существующей автомагистрали М-41 (соединяет Душанбе с границей с Республикой Кыргызстан в Карамыке) между Обигармом и Нурободом, которая, как ожидается, будет закрыта к ноябрю. 2023 г. в связи с затоплением водохранилища (река Вахш), созданного в связи со

строительством Рогунской ГЭС (примерно в 100 км к востоку от Душанбе). Дорога проекта разделена на следующие три участка:

(i) Участок 1: Участок Обигарм-Тагикамар протяженностью около 30 км, в том числе 2 туннеля 1,6 км и 1,7 км;

(ii) Участок 2: Тагикамар-Нуробод протяженностью около 44 км, в том числе 1 туннель 2,6 км и 1 длинный временный мост; а также

(iii) Участок 3: Мост длиной около 750 м и подходы к нему.

4. Участок 1 от Обигарм-Тагикамар (км 0+000 до км 30+217), финансируемый АБР, также будет обслуживать села и общины, расположенные вдоль предлагаемой объездной дороги, и другие села и поселки, расположенные вдали от главной дороги, но в настоящее время полагаться на существующую магистраль М41 для доступа к экономическим возможностям и социальным услугам.

5. Дорога проекта будет проходить в обход части существующей автомагистрали М 41 в 1 км к югу от города Обигарм, которая будет затоплена из-за будущего Рогунского водохранилища, и будет проходить по старой трассе, которая была частично построена в 1980-х годах и заброшена. Он проходит через холмистую сельскую и гористую местность на протяжении 33 км через деревни Бозорак, Лабиджар, Кандак, Ш.Аслон, Дехи Алишо, Джавжи Поён, Садокат и Сияхгулак. Как упоминалось ранее, участок дороги также обслуживает другие деревни и поселки, которые расположены вдали от главной дороги, но в настоящее время зависят от существующей автомагистрали М41 для доступа к экономическим возможностям и социальным услугам. Проектная дорога заканчивается недалеко от южного входа в туннель Тагикамар (туннель №3). На Рисунке 1 показано расположение проектной дороги.

Рис 1: Расположение проектной дороги

2. ОБЪЕМ И ЦЕЛЬ ПОЛУГОДОВОГО ОТЧЕТА О МОНИТОРИНГЕ ГАРАНТИЙ

2.1 Объем отчета

6. Объем работ, определенный для КУП в Техническом задании (ТЗ), включает управление вынужденным переселением, где мониторинг и отчетность о реализации социальных гарантий во время строительства подчеркнуты как одна из ключевых обязанностей, включая подготовку полугодовых социальных гарантий отчеты о мониторинге проекта.

7. Учитывая, что проект был отнесен к **категории «B»** в соответствии с защитной политикой АБР в отношении вынужденного переселения, и что Проект не вызовет значительного воздействия вынужденного переселения, ПОЗП требует только внутреннего мониторинга. Предполагается, что ЦРП РД при содействии специалистов КУП по переселению будет проводить внутренний мониторинг реализации ПОЗП и любых других мероприятий, связанных с социальной защитой, посредством реализации проекта.

2.2 Цель отчета

8. Целью этого внутреннего мониторинга является мониторинг процесса реализации ПОЗП, чтобы гарантировать, что реализация проекта соответствует требованиям Заявления о политике защитных мер АБР, 2009 (ПЗМ) и других соответствующих правовых и политических рамок Правительства, как согласовано в ПОЗП. Одним из основных средств передачи результатов ЦРП РД в АБР являются полугодовые отчеты о мониторинге социальных гарантий.

9. Целью этого внутреннего мониторинга является мониторинг процесса реализации ПОЗП, чтобы гарантировать, что реализация проекта соответствует требованиям Заявления о политике защитных мер АБР, 2009 (ПЗМ) и других соответствующих правовых и политических рамок Правительства, как согласовано в ПОЗП. Одним из основных средств передачи результатов ЦРП РД в АБР являются полугодовые отчеты о мониторинге социальных гарантий:

- Оценить физический прогресс проекта.
- Проанализировать консультации и процессы раскрытия информации, проведенные с пострадавшими домохозяйствами и перемещенным населением.
- Документировать Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) проекта и прогресс в рассмотрении жалоб.
- Мероприятия по реализации гендерной проблематики.
- Определить критические проблемы социальных гарантий и порекомендуйте решения для решения этих проблем.

2.3 Методология подготовки отчета

10. Как отмечалось ранее, формулировка этого полугодового отчета соответствует внутреннему механизму мониторинга, изложенному в ПОЗП. Методология, принятая для подготовки настоящего отчета, включает рассмотрение соответствующих ежемесячных отчетов о ходе работ КУП и Консультанта по строительному надзору (КНС), а также других имеющихся документов. Для подготовки Дополнения к ПОЗП дороги Обигарм-Тагикамар специалист по переселению КУП (местный) провел

обширные выезды на места и провел перепись и исследование ИП (инвентаризация потерь) в период с 06 сентября по 20 октября 2022 г.

Данные, необходимые для составления отчета, были собраны в ходе посещений объекта, консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами и подрядчиком, а также затронутыми лицами и их населением. Информация об именах затронутых лиц, с которыми встречались в течение отчетного периода и когда, доступна в Базе данных, созданной для подготовки Дополнения к ПОЗП.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В ИЮЛЕ – ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

3.1 Общий статус проекта

11. На конец отчетного периода проект находится в стадии реализации; однако в медленном темпе. КУП оказывает необходимую поддержку проекту комментариями, обзорами и отчетами с целью успешной реализации проекта в рамках бюджета и сроков с наименьшими отклонениями, придерживаясь руководящих принципов и мер безопасности в соответствии с контрактом и политиками АБР.

12. В течение отчетного периода в отчетах КНС также отмечалось, что работа идет медленно, а задержки со временем увеличиваются. Об этих задержках подрядчик был уведомлен в нескольких письменных предупреждениях КНС. Все необходимые предупреждения и инструкции были зафиксированы в протоколах совместных еженедельных совещаний, на которых присутствовали представители ЦРП РД, КУП, КНС и Подрядчика. Необходимость пересмотренной рабочей программы в соответствии со всеми известными условиями была доведена до сведения подрядчика, подрядчик представил свою пересмотренную рабочую программу, которая в настоящее время находится на рассмотрении.

3.2 Физический прогресс проекта

13. К декабрю 2022 года целевой совокупный физический прогресс должен был составить 50,17%, но, согласно последней информации, совокупный прогресс составил 20,48%. Подробное обновление состояния прогресса показано в таблице 3.

Таблица 3: Прогресс проекта

Работы	Местоположение	Выполненный объем (шт/м3/м)	Общий объем (шт/м3/м)	Прогресс работ, %
Водопропускные трубы	км7+442	143.93	143.93	100.00%
Водопропускные трубы	км8+573	88.94	88.94	100.00%
Водопропускные трубы	км23+968	39.71	39.71	100.00%
Водопропускные трубы	км24+968	42.43	42.43	100.00%
Водопропускные трубы	км30+023	266.46	638.2	41.75%
Габионные подпорные стены	км15+414-км15+494	1450	1902	76.24%
Габионные подпорные стены	Км16+185 -км16+248	1196	2280	52.46%
Габионные подпорные стены	км16+396 - км16+491	477	512	93.16%

Габионные подпорные стены	Км16+566-км16+685	1350	2216	60.92%
Габионные подпорные стены	Км17+945-км18+155	1373	2016	68.11%
Габионные подпорные стены	Км24+355-км24+415	1583	2680	59.07%
Габионные подпорные стены	км24+750 - км24+803	1192	1300	91.69%
Габионные подпорные стены	км24+880- км24+975	163	1510	10.79%
Габионные подпорные стены	км25+521 - км25+595	1498	1549	96.71%
Бетонные подпорные стены	км 9+360- км 9+529	225	606	37.13%
Бетонирование опор моста № 2	км13+097	255	2256.05	11.30%
Бетонирование стен опоры моста №1	Км 7+786,38	160.5	160.5	100.00%
Бетонирование опор моста № 2	км13+097	2256.05	2256.05	100.00%
Бетонирование опор моста № 3	км13+550	588.43	588.43	100.00%
Свайные работы, мост № 4	Км20+910	29	64	45.31%
Бетонирование стен опоры моста №5	Км27+100	2	4	50.00%
Бетонирование опор моста № 5	Км27+100	145	575	25.22%
Насыпь	км2+180-км2+500	6700	46280.88	14.48%
Общие разработки	км3+440 - км3+920	104800	149737.12	69.99%
Насыпь	км14+380	5030	2709.17	185.67%
Насыпь	км17+030	4450	9526.53	46.71%
Насыпь	км18+300	1210	3905.17	30.98%
Скальные разработки	км19+600	12500	34729.48	35.99%
Скальные разработки	км19+100 - км19+300	22700	27030.35	83.98%
Скальные разработки	км19+800	12400	52397.22	23.67%
Скальные разработки	Км26+000	33100	76763.59	43.12%
Проходка и крепь туннеля Кандак	км11+371.10 - км11+744.50	373.4	1611	51%
	км12+350.92 - км12+935.70	584.78		77%
Проходка и крепь туннеля Карагач	км21+108.24-21+75.24	167.5	1701	27.93%
	км22+745.9 - км22+537.5.5	208.4		30.96%

Лоток туннеля Кандак	км11+371.10- m11+515.10	180	1611	22.35%
	км12+767.7 - км12+935.70	228		28.31%
Лоток туннеля Карагач	км21+108.24	0	1701	0.00%
	км22+946.00 - км22+850.00	96		19.75%
Бетонная обделка туннеля Кандак	км21+108.24	48	1611	5.96%
	км22+946.00 - км22+850.00	108		13.41%
Бетонная обделка туннеля Карагач	км21+108.24	0	1701	0.00%
	км22+946.00 - км22+886.00	84		9.88%

Источник: Отчеты о ходе работы Консультанта по строительному надзору.

14. Помесячный план по сравнению с фактическим прогрессом представлен в Таблице 4 за отчетный период. Видно, что фактический прогресс был значительно ниже запланированного на протяжении всего отчетного периода.

Таблица 4: Месячный план по сравнению с фактическим ходом проекта

Месяц	Планируемый прогресс (%)	Фактический прогресс (%)	Совокупный запланированный прогресс (%)	Совокупный фактический прогресс (%)
Июль 2022г	5.12%	1.83%	33.21%	10.07%
Авг 2022г	5.19%	2.13%	35.39%	12.20%
Сент 2022г	5.25%	2.14%	39.70%	14.34%
Окт 2022г	4.18%	2.42%	43.88%	16.76%
Нояб 2022г	3.56%	2.11%	47.44%	18.87%
Дек 2022г	2.73%	1.61%	50.17%	20.48%

Источник: Отчеты о прогрессе консультанта по надзору за строительством.

15. Следующие причины были объяснены задержкой в продвижении физической активности, которые не были предусмотрены во время проектирования:

i. **Отставание в туннельных работах:** Подрядчик недавно начал туннельные работы. Основной причиной этого стала задержка с доставкой в Таджикистан материалов, оборудования и техники, необходимых для проходки туннелей. Следует отметить, что подрядчик был предупрежден во время переговоров по контракту и ему было предложено принять необходимые меры предосторожности в отношении Covid-19 и не прерывать работы во время подписания контракта. Головной офис Подрядчика провел необходимую переписку с китайской таможней и попросил как можно скорее ускорить работу с ожидающими грузовиками. С ускорением работы на китайской таможне ожидающие грузовики въезжали в Таджикистан один за другим. В настоящее время работы идут полным ходом на обеих сторонах туннелей Кандак и Карагач.

ii. **Отставание в мостовых работах:** Точно так же были проблемы с доставкой сваебойных машин для использования в мостовых работах, и работы были начаты с использованием арендованных сваебойных машин у местных компаний в Таджикистане. Проблемы, связанные с мобилизацией оборудования для мостов, решались параллельно с оборудованием для туннелей. В настоящее время активно ведутся свайные работы с использованием 8 сваебойных машин на 1, 2 и 3 мостах.

iii. **Отставание поставки габионных материалов:** габионные материалы были доставлены на строительную площадку 24 февраля 2022 года. Подрядчик провел соответствующие испытания материалов габионных коробок и, после успешных лабораторных испытаний, приступил к установке габионных коробок в соответствии с Программа работ.

iv. **Отставание строительных работ:** Проект включает строительство железобетонных подпорных стен и водопропускных труб. С наступлением более благоприятных погодных условий Подрядчик активно набирает рабочую силу для выполнения инженерных работ.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУГОДОВОГО МОНИТОРИНГА ГАРАНТИЙ

4.1 ПОЗП для основной дороги

16. Как упоминалось ранее, Проект был отнесен к категории «B» в соответствии с защитной политикой АБР, и что Проект не приведет к значительному вынужденному переселению, и, таким образом, ПОЗП для Главной трассы требует только внутреннего мониторинга. Таким образом, ЦРП РД проводит внутренний мониторинг реализации ПОЗП при содействии специалистов по переселению КУП.

17. Этот ПОЗП был размещен на веб-сайте АБР и МТ в июле 2019 года. Он был одобрен МТ в августе 2019 года, после чего АБР не выдвинул никаких возражений. Этот ПОЗП был размещен на веб-сайте АБР и МТ в июле 2019 года. Он был одобрен МТ в августе 2019 года, после чего АБР не выдвинул никаких возражений. Между тем, отчет о соответствии[1] ПОЗП был подготовлен в августе 2020 года ЦРП РД. Отчет о соответствии подтвердил, что реализация ПОЗП была удовлетворительной и успешной, и что Проект соответствовал принципам защиты, изложенным в ПЗМ 2009 АБР, а также национальным законам и нормативным актам. ПВП, как часть механизма мониторинга, поручил КУП оказать помощь ЦРП РД во внутреннем мониторинге, чтобы обеспечить своевременное принятие соответствующих мер для устранения любых непредвиденных воздействий, связанных с отводом земли и переселением (ОЗП).

18. Во время выполнения физических работ были выявлены некоторые проблемы ИЗП, которые не были включены в исходный документ ПОЗП. В соответствии с механизмом реализации, упомянутым в ПОЗП, команда КУП помогает ЦРП РД зафиксировать все такие вопросы и подготовить дополнение к ПОЗП для основного согласования. Методология, представленная КУП для выполнения задачи, была одобрена ЦРП РД. КУП провела социальный опрос и собрала данные для записи дополнительных вопросов ОЗП на основной трассе. КУП представил проект Дополнения в ЦРП РД под исх. № DCIHO-CAREC-09. BG/01/01-65.

[1] Отчет о выполнении плана отвода земли и переселения, август 2020 г. Участок дороги Обигарм-Тагикамар (Участок 1), Центр реализации проекта реабилитации дорог при Министерстве транспорта Республики Таджикистан.

4.2 Подъездные дороги к селам

19. Как уже упоминалось, в рамках проекта реабилитированы 11 подъездных дорог села общей протяженностью около 30 км. Все эти подъездные дороги входят в основную трассу, как показано на рисунке 2.

Во избежание воздействия отвода земли и переселения (ОЗП) предполагается, что улучшение подъездных дорог к селам будет осуществляться на имеющейся ширине дорог. В таком случае специалисты КУП окажут помощь в подготовке ОСО, которая может начаться сразу же после получения указания компетентным органом. Для выполнения этой задачи специалисты КУП будут помогать в подготовке ОСО в качестве альтернативы ПОЗП, который может начаться в ближайшее время по согласованию с ЦРП РД с целью представить отчет к середине июня 2023 года. Как уже упоминалось, специалисты КУП приступят к помощи ЦРП РД в подготовке отчета о результатах анализа с целью предоставить отчет к середине июня 2023 г.

Рис 2: Подъездные дороги к селам

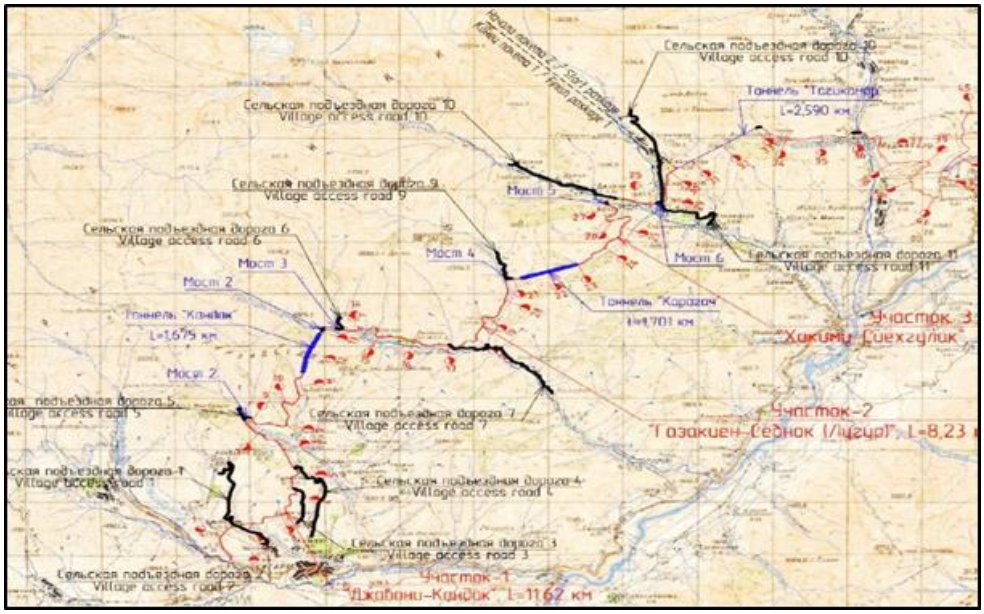

20. Улучшение подъездных дорог к селам облегчит доступ населения к проектируемой дороге М 41. Эти сельские дороги (обычно шириной 5 м) планируется улучшить в пределах существующей трассы, насколько это возможно, чтобы оказать минимальное влияние на переселение.

21. Проект включает реабилитацию 11 подъездных дорог села общей протяженностью около 30 км. Все эти подъездные пути входят в основную трассу. Проекты этих подъездных дорог, которые были выполнены, пересматриваются, чтобы иметь минимальное или полное отсутствие изъятия земли.

22. Чтобы избежать последствий отвода земли и переселения (ОЗП), улучшение подъездных дорог к селам будет осуществляться на существующей доступной ширине дорог. Для выполнения этой задачи специалисты КУП окажут помощь в подготовке ОСО в качестве альтернативы ПОЗП, который может начаться в ближайшее время по согласованию с ЦРП РД, с целью предоставить отчет к середине июня 2023 года, а строительство подъездных дорог к селам планируется начать в июле 2023 года.

4.3 Полевой выезд, консультации и обзорные встречи

23. 4 августа 2022 года группа КУП совершила выезд на место для изучения воздействия ОЗП вдоль дороги Обигарм-Тагикамар. В результате этого визита команда получила первоначальное представление о масштабах воздействия на ЗД, которые не были перечислены в первоначальном ПОЗП, подготовленном в августе 2019 года. Это дополнительное воздействие ПОЗП вызвало необходимость подготовки Дополнения к ПОЗП, проведения дополнительной инвентаризации. обследование для проведения инвентаризации потерь (ИП).

24. Команда КУП посетила проектные площадки, в то время как АБР направил обзорную миссию с 21 по 31 декабря 2022 года и посетил некоторые участки дороги Обигарм-Тагикамар. Во время посещения месторождения 26 декабря 2022 года группа КУП присутствовала на консультационном совещании, проведенном в лагере подрядчика, вместе с представителями ЦРП РД, КНС и подрядчика. Некоторые фотографии таких консультаций и обзорных совещаний за этот отчетный период показаны на рисунке 3.

25. Социальный эксперт АБР посетил проектную площадку 23 декабря 2022 г. Эксперт также провел встречу в ЦРП РД 29 декабря 2022 г. Руководитель группы КУП и старший специалист по переселению также посетили проект в декабре 2022 г. Социальный эксперт АБР.

Рис 3: Фотографии визитов на стройплощадку и совещаний

Команда КУП вместе со специалистом по социальным вопросам АБР, должностными лицами ЦРП РД и представителями КНС и подрядчика посещает проектные площадки 26 декабря 2022г.	Команда КУП присутствует на консультационном совещании 26 декабря 2022 года вместе с представителями ЦРП РД, КНС и подрядчика.

Обзорная встреча на месте, организованная социальным экспертом АБР, 23 декабря 2022 года.	Тренинг, проведенный специалистом АБР по защитным мерам 29 ноября 2022 г.
Определение местоположения торговых площадок по согласованию с главами деревень 16 ноября 2022 г.	Совместное Обзорное совещание от 10 августа 2022 г.
Совместный полевой визит от 4 августа 2022 г.	Совместное Обзорное совещание от 28 июля 2022 г.

4.4 Механизм рассмотрения жалоб

26. Было понятно, что большинство проблем возникает из-за отсутствия диалога между местными властями и Подрядчиком. Руководитель группы КУП рекомендовал Подрядчику и представителям сел поддерживать и улучшать связь и своевременно решать проблемы. Было решено, что лидеры джамоатов должны поручить людям писать свои жалобы, если они у них есть, и помещать их в ящик для жалоб.

27. ПОЗП проекта включал в себя создание гибкого, легкодоступного и приемлемого с культурной точки зрения механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), способного получать и способствовать разрешению проблем и жалоб затронутых лиц (ЗЛ), связанных с проектом. МРЖ — это формализованный способ ЦРП РД для выявления и решения проблем и жалоб ЗЛ. Он предлагает им форум, на котором они могут высказать свои опасения, получить разъяснения по своим вопросам или зарегистрировать жалобы, связанные с работой Проекта.

28. В соответствии с письмом МТ № 872 от 27 августа 2018 года в джамоатах/селах в каждом из 7 проектных сел созданы комитеты по рассмотрению жалоб (КРЖ), которые будут функционировать в течение всего срока реализации проекта. Было сформировано семнадцать GRC. Контактное лицо (КП) назначается в каждом джамоате и в ЦРП РД Министерства транспорта. Контактные данные человека должным образом доводятся до сведения людей. В состав КРЖ входили следующие учреждения и представители ЗЛ: (i) глава джамоата; (ii) секретарь джамоата, землеустроитель или другой специалист; (iii) глава села; (iv) житель села, представитель ЗЛ; (v) жительница села; (vi) представители НПО, действующие в этом регионе.

29. В состав ЦРП РД входят: (i) заместитель исполнительного директора; (ii) два главных специалиста по переселению; (iii) юрист МТ, главный инженер и другие специалисты по мере необходимости.

4.4.1 Статус мониторинга и рассмотрения жалоб в течение отчетного периода

4.4.1.1 Статус мониторинга жалоб

30. За отчетный период было подано 9 жалоб, и все они были разрешены. Помимо этих 9 разрешенных жалоб, на конец отчетного периода не было нерассмотренных жалоб, требующих разрешения/закрытия.

31. Всего за отчетный период с июля по декабрь 2022 г. через КРЖ было подано 9 жалоб, как указано в Таблице 5 ниже.

Таблица 5: Статус мониторинга жалоб

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
245	7/2/2022г	Кодиров С. Село Шохи Аслон	Помощь в водоснабжении (устно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	7/2/2022г	Начальник участка № 2	Предоставлена труба	7/3/2022г
277	8/3/2022г	Холов Азимхон, село Бозорак Тел.: 985820971	Повреждение шланга (письменно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	7/3/2022г	Начальник участка № 1	Был выделен шланг длиной 200 м, d-63	7/3/2022г
289	8/15/2022г	Одинаев Холмурод, село Дусти Солех, тел.: 938644609	Повреждение трубы и водоколлектора (письменно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	8/15/2022г	Начальник участка № 1	Выплачена компенсация на покупку шланга (400 сомони)	9/7/2022г
293	8/19/2022г	Махсумов Илмуддин, село Дараи Тутак	Жалоба на подачу воды (устно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	8/19/2022г	Начальник участка № 1	Выделен шланг длиной 75м и 2 муфты d-45мм	8/22/2022г
296	8/22/2022г	Назиршоев Маликшо, село Хакими	Жалоба на размещение грунта на	Начмиддинов Джамшед 905303843	8/22/2022г	Начальник участка № 3	Река восстановлена. Произведено	9/25/2022г

			отвале на км 25+340, в результате чего нанесен ущерб посевам и жилью				уплотнение грунта у подножия отвала	
308	9/2/2022г	Дустов Нурулло, село Дусти Солех, тел.: 939094024	Повреждение шланга (письменно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	9/2/2022г	Начальник участка № 1	Выделено 2 трубы длиной 6м, d-50мм	12/2/2022г
323	9/17/2022г	Абдулхамидов Хасан, село Дуст Солех	Повреждение забора (устно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	5/31/2022г	Начальник участка № 1	Выделена компенсация за устранение повреждений на участке, приобретение защитной сетки (2000 сом.)	9/17/2022г
383	11/16/2022г	Умаров Зоиршо, село Калтахо	В ходе земляных работ родник оказался под грунтом (устная жалоба)	Начмиддинов Джамшед 905303843	11/16/2022г	Начальник участка № 1	Подрядчик убрал грунт	11/20/2022г
394	11/27/2022г	Халикова Азизмо, село Кандак, тел: 907664746	В ходе землянных работ Подрядчика двор Халиковой А. был засыпан грунтом (устно)	Начмиддинов Джамшед 905303843	11/27/2022г	Начальник участка № 1	Двор был очищен от грунта работниками Подрядчика	12/2/2022г

4.4.1.2 Статус рассмотрения жалоб

32. Как упоминалось ранее, жалобы были незначительными по своему характеру, и все эти претензии были разрешены. Типы жалоб и процесс их разрешения показаны в Таблице 5 выше. Записи жалоб за июль-декабрь 2022 года приведены в приложении 1.

33. Запись, анализ, разрешение и документирование жалоб продолжаются и будут продолжаться в течение всего периода реализации проекта. Тем не менее, все 9 жалоб, зарегистрированных в отчетном периоде, были разрешены к полному удовлетворению заявителей.

4.5 Реализация Плана действий по гендерным вопросам

4.5.1 Мониторинг ГПД

34. В соответствии с компонентом 11 Проекта дорожного строительства «Коридоры Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 2, 3 и 5 (Обигарм-Нуробад) – Лот 1» был разработан специальный раздел «Гендерное развитие и мониторинг», в том числе Гендерный План действий (ГПД) на период 2021 -2024 гг. Цель ГПД заключалась в усилении и защите гендерных аспектов проекта, включая реализацию и мониторинг результатов.

4.5.2 Мероприятия по реализации гендерной проблематики

35. Специалист КУП по гендерным вопросам неоднократно выезжал на места с целью проведения обсуждения в фокус-группе (ФГД) с женщинами сел в зоне реализации проекта и определения подходящих мест для создания рынков с целью передачи и улучшения их навыков и повышения потенциала заработка, а также информировать их о своих правах.

36. 6 октября 2022 года состоялось обсуждение реализации ГПД в данном проекте через ZOOM с представителями АБР Рикой-сан, Гульнорой Холовой, координатором ЦРП РД по вопросам социальной защиты Мухайе Алимшоевой, специалистом по гендерным вопросам КУП Аллой Куватовой при содействии Гульбахор, переводчика. В ходе встречи была отмечена реализация ГПД по трем основным результатам. На встрече АБР попросил специалиста по гендерным вопросам КУП провести дополнительную дискуссию в фокус-группах с женщинами в разных джамоатах с целью повышения их деловых навыков и информации в маркетинговых исследованиях. С этой целью, Группа посетила поле и провела встречу 12 октября 2022 года.

37. В ходе встречи с представителями махаллинского совета и женщин в проекте было подчеркнуто, что все объекты инфраструктуры будут построены с учетом ГПД, отдельные туалеты для женщин и мужчин, комнаты материнства и остановки, оборудованные для лиц с ограниченными возможностями. Еще одна ФГД была проведена в селе Лайрон джамоата Хакими, и были проведены обсуждения с женщинами о возможностях расширения их экономического участия в семейной жизни, привития знаний в области предпринимательства и т. д. Несколько женщин выразили желание пройти программы обучения бизнесу и предпринимательству в этих встречи. Таким образом, встречи в целом были плодотворными.

38. Два предварительных местоположения рынка находятся на км 6 и км 13+900, планировка должна быть доработана по согласованию с ЦРП РД.

5. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

5.1 Записи несоблюдений и рекомендации

39. В ходе строительных работ Проект должен:

a) проводить больше консультаций на уровне села с людьми, затронутыми проектом, и их сообществом, чтобы избежать и смягчить непредвиденные проблемы ОЗП;

b) записывать все жалобы в Формы регистрации жалоб (ФРГ), и их реестр должен вестись, независимо от того, были ли они обоснованными жалобами или нет, и даже если они были разрешены немедленно; и

c) подготовить заявление о разрешении жалобы, также указав даты, когда жалобы были разрешены, а также запись решений по конкретным жалобам.

Приложение 2: записи жалоб

Июль ~ Дек. 2022г

Июль 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
244	7/1/2022г	Жалоб не поступало						
245	7/2/2022г	Кодиров С. село Шохи Аслон	Помощь в водоснабжении (устно)	Начмиддинов Джамшед.	7/2/2022	Начальник участка № 2	Труба предоставлена	7/3/2022
246	7/3/2022г	Жалоб не поступало						
247	7/4/2022г	Жалоб не поступало						
248	7/5/2022г	Жалоб не поступало						
249	7/6/2022г	Жалоб не поступало						
250	7/7/2022г	Жалоб не поступало						
251	7/8/2022г	Жалоб не поступало						
252	7/9/2022г	Жалоб не поступало						
253	7/10/2022г	Жалоб не поступало						
254	7/11/2022г	Жалоб не поступало						

255	7/12/2022г	Жалоб не поступало						
256	7/13/2022г	Жалоб не поступало						
257	7/14/2022г	Жалоб не поступало						
258	7/15/2022г	Жалоб не поступало						
259	7/16/2022г	Жалоб не поступало						
260	7/17/2022г	Жалоб не поступало						
261	7/18/2022г	Жалоб не поступало						
262	7/19/2022г	Жалоб не поступало						
263	7/20/2022г	Жалоб не поступало						
264	7/21/2022г	Жалоб не поступало						
265	7/22/2022г	Жалоб не поступало						
266	7/23/2022г	Жалоб не поступало						
267	7/24/2022г	Жалоб не поступало						
268	7/25/2022г	Жалоб не поступало						
269	7/26/2022г	Жалоб не поступало						
270	7/27/2022г	Жалоб не поступало						
271	7/28/2022г	Жалоб не поступало						
272	7/29/2022г	Жалоб не поступало						
273	7/30/2022г	Жалоб не поступало						
274	7/31/2022г	Жалоб не поступало						

Август 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
275	8/1/2022г	Жалоб не поступало						
276	8/2/2022г	Жалоб не поступало						
277	8/3/2022г	Холов Азимхон, село Бозорак тел.: 985820971	Поврежден шланг (письменно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	7/3/2022г	Начальник участка № 1	Выделено 200 м шланга, d-63	7/3/2022г
278	8/4/2022г	Жалоб не поступало						
279	8/5/2022г	Жалоб не поступало						
280	8/6/2022г	Жалоб не поступало						
281	8/7/2022г	Жалоб не поступало						
282	8/8/2022г	Жалоб не поступало						
283	8/9/2022г	Жалоб не поступало						
284	8/10/2022г	Жалоб не поступало						
285	8/11/2022г	Жалоб не поступало						
286	8/12/2022г	Жалоб не поступало						
287	8/13/2022г	Жалоб не поступало						
288	8/14/2022г	Жалоб не поступало						
289	8/15/2022г	Одинаев Холмурод, село Дуст Солех, тел: 938644609	Повреждение трубы и водоколлектора (письменно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	8/15/2022г	Начальник участка № 1	Выплачена компенсация за покупку шланга (400 сом.)	9/7/2022г
290	8/16/2022г	Жалоб не поступало						

291	8/17/2022г	Жалоб не поступало						
292	8/18/2022г	Жалоб не поступало						
293	8/19/2022г	Махсумов Илмуддин, село Дараи Тутак	Жалоба на подачу воды (устно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	8/19/2022г	Начальник участка № 1	Выделен шланг длиной 75м и 2 муфты d-45мм	8/22/2022г
294	8/20/2022	Жалоб не поступало						
295	8/21/2022	Жалоб не поступало						
296	8/22/2022г	Назиршоев Маликшо, село Хакими	Жалоба на размещение грунта на отвале на км 25+340, в результате чего нанесен ущерб посевам и жилью	Начмиддинов Джамшед. 905303843	8/22/2022г	Начальник участка № 3	Река восстановлена. Произведено уплотнение грунта у подножия отвала	9/25/2022г
297	8/23/2022г	Жалоб не поступало						
298	8/24/2022г	Жалоб не поступало						
299	8/25/2022г	Жалоб не поступало						
300	8/26/2022г	Жалоб не поступало						
301	8/27/2022г	Жалоб не поступало						
302	8/28/2022г	Жалоб не поступало						
303	8/29/2022г	Жалоб не поступало						
304	8/30/2022г	Жалоб не поступало						
305	8/31/2022г	Жалоб не поступало						

Сентябрь 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
307	9/1/2022г	Жалоб не поступало						
308	9/2/2022г	Дустов Нурулло, село Дуст Солех, тел: 939094024	Повреждение шланга (письменно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	9/2/2022г	Начальник участка № 1	Выделено 2 трубы длиной 6м, d-50мм	12/2/2022г
309	9/3/2022г	Жалоб не поступало						
310	9/4/2022г	Жалоб не поступало						
311	9/5/2022г	Жалоб не поступало						
312	9/6/2022г	Жалоб не поступало						
313	9/7/2022	Жалоб не поступало						
314	9/8/2022	Жалоб не поступало						
315	9/9/2022	Жалоб не поступало						
316	9/10/2022	Жалоб не поступало						
317	9/11/2022г	Жалоб не поступало						
318	9/12/2022г	Жалоб не поступало						

319	9/13/2022г	Жалоб не поступало						
320	9/14/2022г	Жалоб не поступало						
321	9/15/2022г	Жалоб не поступало						
322	9/16/2022г	Жалоб не поступало						
323	9/17/2022г	Абдулхамидов Хасан, село Дуст Солех	Повреждение забора (устно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	5/31/2022 г	Начальник участка № 1	Выплачена компенсация на покупку защитной сетки (2000 сом.)	9/17/2022г
324	9/18/2022г	Жалоб не поступало						
325	9/19/2022г	Жалоб не поступало						
326	9/20/2022г	Жалоб не поступало						
327	9/21/2022г	Жалоб не поступало						
328	9/22/2022г	Жалоб не поступало						
329	9/23/2022г	Жалоб не поступало						
330	9/24/2022г	Жалоб не поступало						
331	9/25/2022г	Жалоб не поступало						
332	9/26/2022г	Жалоб не поступало						
333	9/27/2022г	Жалоб не поступало						
334	9/28/2022г	Жалоб не поступало						
335	9/29/2022г	Жалоб не поступало						
336	9/30/2022г	Жалоб не поступало						

Октябрь 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
337	10/1/2022г	Жалоб не поступало						
338	10/2/2022г	Жалоб не поступало						
339	10/3/2022г	Жалоб не поступало						
340	10/4/2022г	Жалоб не поступало						
341	10/5/2022г	Жалоб не поступало						
342	10/6/2022г	Жалоб не поступало						
343	10/7/2022г	Жалоб не поступало						
344	10/8/2022г	Жалоб не поступало						
345	10/9/2022г	Жалоб не поступало						
346	10/10/2022г	Жалоб не поступало						

347	10/11/2022г	Жалоб не поступало						
348	10/12/2022г	Жалоб не поступало						
349	10/13/2022г	Жалоб не поступало						
350	10/14/2022г	Жалоб не поступало						
351	10/15/2022г	Жалоб не поступало						
352	10/16/2022г	Жалоб не поступало						
353	10/17/2022г	Жалоб не поступало						
354	10/18/2022г	Жалоб не поступало						
355	10/19/2022г	Жалоб не поступало						
356	10/20/2022г	Жалоб не поступало						
357	10/21/2022г	Жалоб не поступало						
358	10/22/2022г	Жалоб не поступало						
359	10/23/2022г	Жалоб не поступало						
360	10/24/2022г	Жалоб не поступало						
361	10/25/2022г	Жалоб не поступало						

362	10/26/2022г	Жалоб не поступало						
363	10/27/2022г	Жалоб не поступало						
364	10/28/2022г	Жалоб не поступало						
365	10/29/2022г	Жалоб не поступало						
366	10/30/2022г	Жалоб не поступало						
367	10/31/2022г	Жалоб не поступало						

Ноябрь 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
368	11/1/2022г	Жалоб не поступало						
369	11/2/2022г	Жалоб не поступало						

370	11/3/2022г	Жалоб не поступало						
371	11/4/2022г	Жалоб не поступало						
372	11/5/2022г	Жалоб не поступало						
373	11/6/2022г	Жалоб не поступало						
374	11/7/2022г	Жалоб не поступало						
375	11/8/2022г	Жалоб не поступало						
376	11/9/2022г	Жалоб не поступало						
377	11/10/2022г	Жалоб не поступало						
378	11/11/2022г	Жалоб не поступало						
379	11/12/2022г	Жалоб не поступало						
380	11/13/2022г	Жалоб не поступало						
381	11/14/2022г	Жалоб не поступало						
382	11/15/2022г	Жалоб не поступало						
383	11/16/2022г	Умаров Зоиршо. с. Калтахо	В ходе земляных работ родник оказался под грунтом (устная)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	11/16/2022	Начальник участка № 1	Подрядчик удалил грунт	11/20/2022
384	11/17/2022г	Жалоб не поступало						
385	18.11.2022г	Жалоб не поступало						
386	11/19/2022	Жалоб не поступало						
387	11/20/2022	Жалоб не поступало						
388	11/21/2022	Жалоб не поступало						
389	11/22/2022	Жалоб не поступало						
390	11/23/2022	Жалоб не поступало						
391	11/24/2022	Жалоб не поступало						
392	11/25/2022	Жалоб не поступало						
393	11/26/2022	Жалоб не поступало						

394	11/27/2022	Халикова Азизмо, с. Кандак, тел: 907664746	В ходе землянных работ Подрядчика двор Халиковой А. был засыпан грунтом (устно)	Начмиддинов Джамшед. 905303843	11/27/2022	Начальник участка № 1	Двор был очищен от грунта работниками Подрядчика	12/2/2022
395	11/28/2022	Жалоб не поступало						
396	11/29/2022	Жалоб не поступало						
397	11/30/2022	Жалоб не поступало						

Декабрь 2022г

№	Дата	ФИО человека, написавшего жалобу и его контакты	Описание жалобы или предложения	Имя принявшего жалобу и его контакты	Дата принятия жалобы	Ответственный по разрешению жалобы и его контакты	Описание принятых мер	Дата принятия меры и статус разрешения жалобы
A	B	C	D	E	F	G	H	I
398	12/1/2022	Жалоб не поступало						
399	12/2/2022	Жалоб не поступало						
400	12/3/2022	Жалоб не поступало						
401	12/4/2022	Жалоб не поступало						
402	12/5/2022	Жалоб не поступало						
403	12/6/2022	Жалоб не поступало						
404	12/7/2022	Жалоб не поступало						

405	12/8/2022	Жалоб не поступало						
406	12/9/2022	Жалоб не поступало						
407	12/10/2022	Жалоб не поступало						
408	12/11/2022	Жалоб не поступало						
409	12/12/2022	Жалоб не поступало						
410	12/13/2022	Жалоб не поступало						
411	12/14/2022	Жалоб не поступало						
412	12/15/2022	Жалоб не поступало						
413	12/16/2022	Жалоб не поступало						
414	12/17/2022	Жалоб не поступало						
415	12/18/2022	Жалоб не поступало						
416	12/19/2022	Жалоб не поступало						
417	12/20/2022	Жалоб не поступало						
418	12/21/2022	Жалоб не поступало						
419	12/22/2022	Жалоб не поступало						
420	12/23/2022	Жалоб не поступало						
421	12/24/2022	Жалоб не поступало						
422	12/25/2022	Жалоб не поступало						
423	12/26/2022	Жалоб не поступало						
424	12/27/2022	Жалоб не поступало						
425	12/28/2022	Жалоб не поступало						
426	12/29/2022	Жалоб не поступало						
427	12/30/2022	Жалоб не поступало						
428	12/31/2022	Жалоб не поступало						

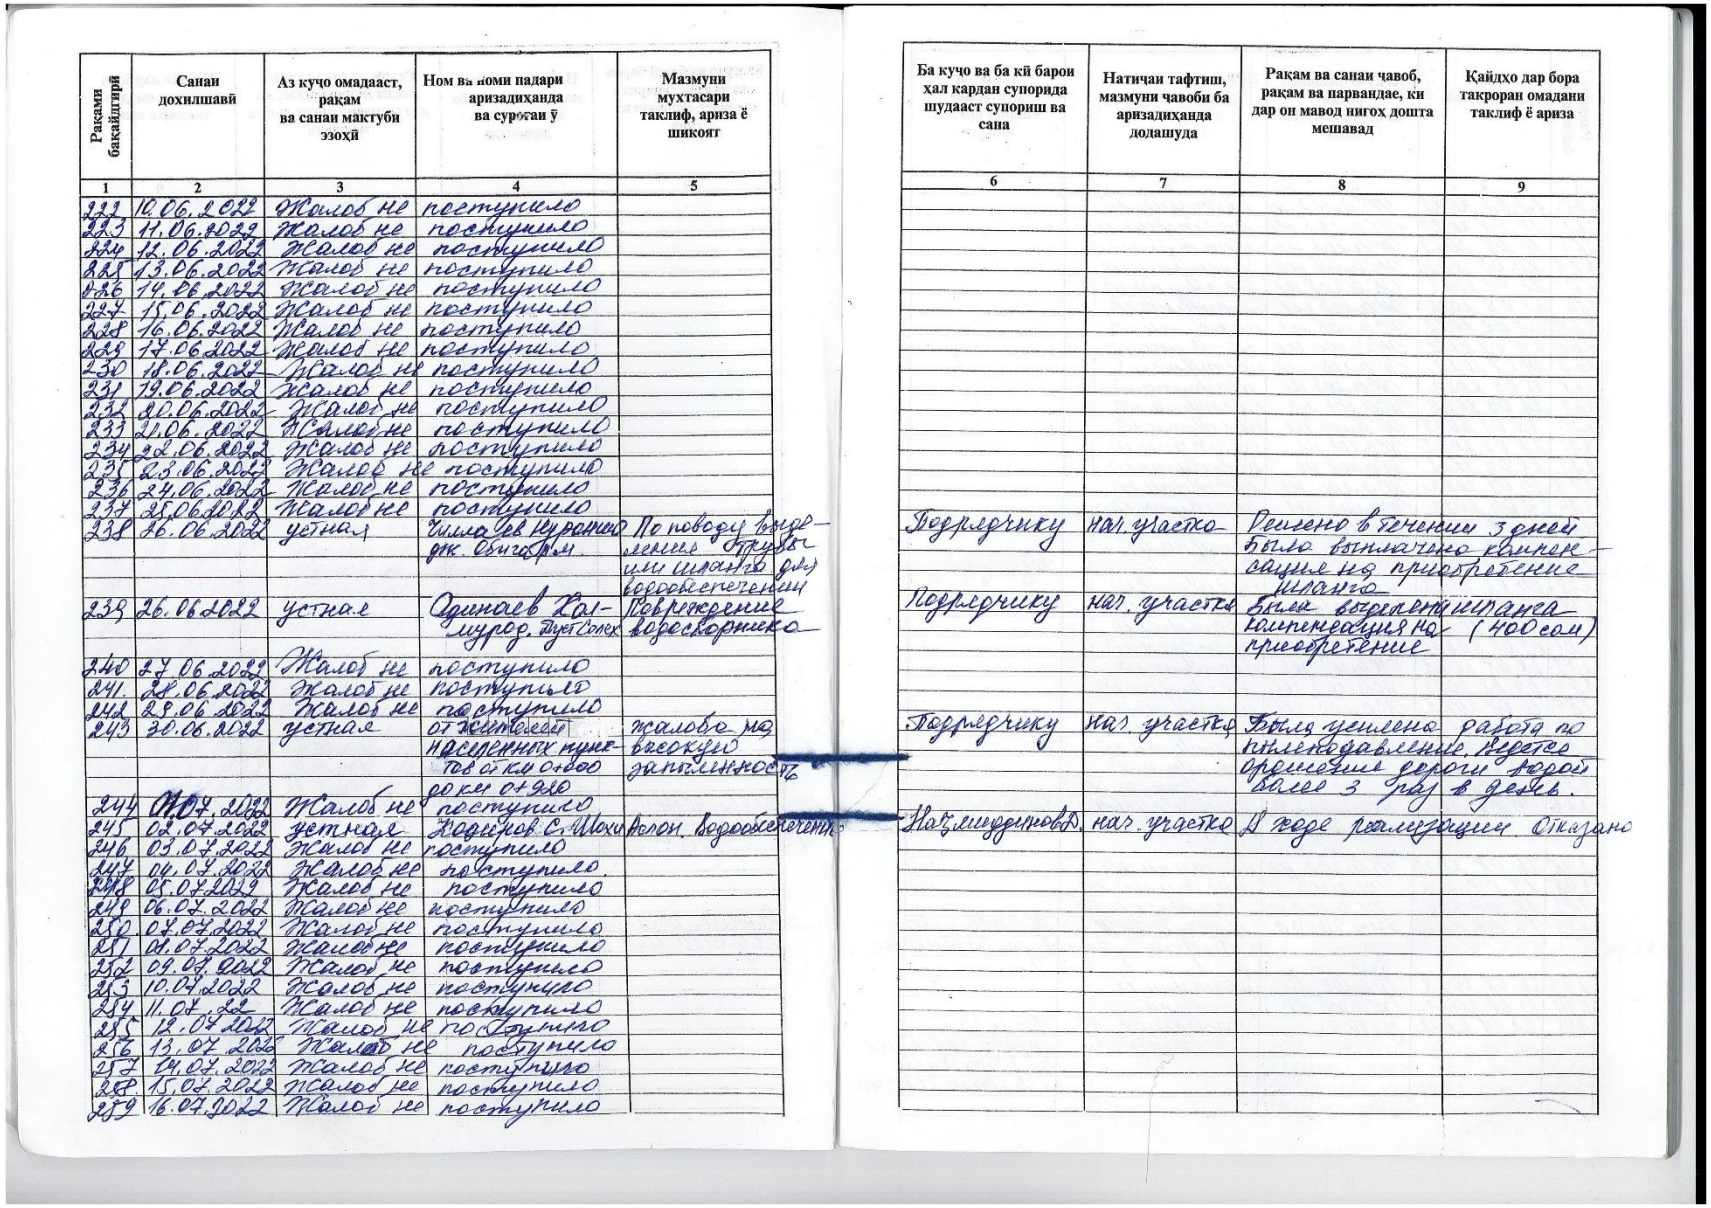

Рақами бакайдгирй	Санаи дохилшавй	Аз кучо омадааст, рақам ва санаи мактуби эзоҳй	Ном ва номи падари аризадиҳанда ва суроғаи ў	Мазмуни мухтасари таклиф, ариза ё шикоят	Ба кучо ва ба кй барои ҳал кардан супорида шудааст супориш ва сана	Натичаи тафтиш, мазмуни чавоби ба аризадиҳанда додашуда	Рақам ва санаи чавоб, рақам ва парвандае, ки дар он мавод нигоҳ дошта мешавад	Қайдҳо дар бора такроран омадани таклиф ё ариза
1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	10.06.2022	Жалоб не	поступило					
223	11.06.2022	жалоб не	поступило					
224	12.06.2022	жалоб не	поступило					
225	13.06.2022	жалоб не	поступило					
226	14.06.2022	жалоб не	поступило					
227	15.06.2022	жалоб не	поступило					
228	16.06.2022	жалоб не	поступило					
229	17.06.2022	жалоб не	поступило					
230	18.06.2022	жалоб не	поступило					
231	19.06.2022	жалоб не	поступило					
232	20.06.2022	жалоб не	поступило					
233	21.06.2022	жалоб не	поступило					
234	22.06.2022	жалоб не	поступило					
235	23.06.2022	жалоб не	поступило					
236	24.06.2022	жалоб не	поступило					
237	25.06.2022	жалоб не	поступило					
238	26.06.2022	устная	Ишмаев Нурлан ул. Обигарм.	По поводу выделения трубы или шланга для водообеспечения	Подрядчику	нач. участка	Решено в течении 3 дней было выписано извещение на приобретение шланга	
239	26.06.2022	устная	Одинаев Халмурод. ул. Колех	Повреждение водосворшика	Подрядчику	нач. участка	Была выделена шланга-наименование на (400 сом) приобретение	
240	27.06.2022	Жалоб не	поступило					
241	28.06.2022	жалоб не	поступило					
242	28.06.2022	жалоб не	поступило					
243	30.06.2022	устная	от жителей населенных пунктов от км 0+000 до км 0+920	жалоба на высокую запыленность	Подрядчику	нач. участка	Была усилена работа по пылеподавлению. Ведется орошение дороги поливомоечной машиной более 3 раз в день.	
244	01.07.2022	Жалоб не	поступило					
245	02.07.2022	устная	Ходиров С. Шохи	Колон. водообеспечения	Наблюдателю	нач. участка	В ходе реализации отказано	
246	03.07.2022	Жалоб не	поступило					
247	04.07.2022	жалоб не	поступило					
248	05.07.2022	жалоб не	поступило					
249	06.07.2022	жалоб не	поступило					
250	07.07.2022	жалоб не	поступило					
251	08.07.2022	жалоб не	поступило					
252	09.07.2022	жалоб не	поступило					
253	10.07.2022	жалоб не	поступило					
254	11.07.22	жалоб не	поступило					
255	12.07.2022	жалоб не	поступило					
256	13.07.2022	жалоб не	поступило					
257	14.07.2022	жалоб не	поступило					
258	15.07.2022	жалоб не	поступило					
259	16.07.2022	жалоб не	поступило					

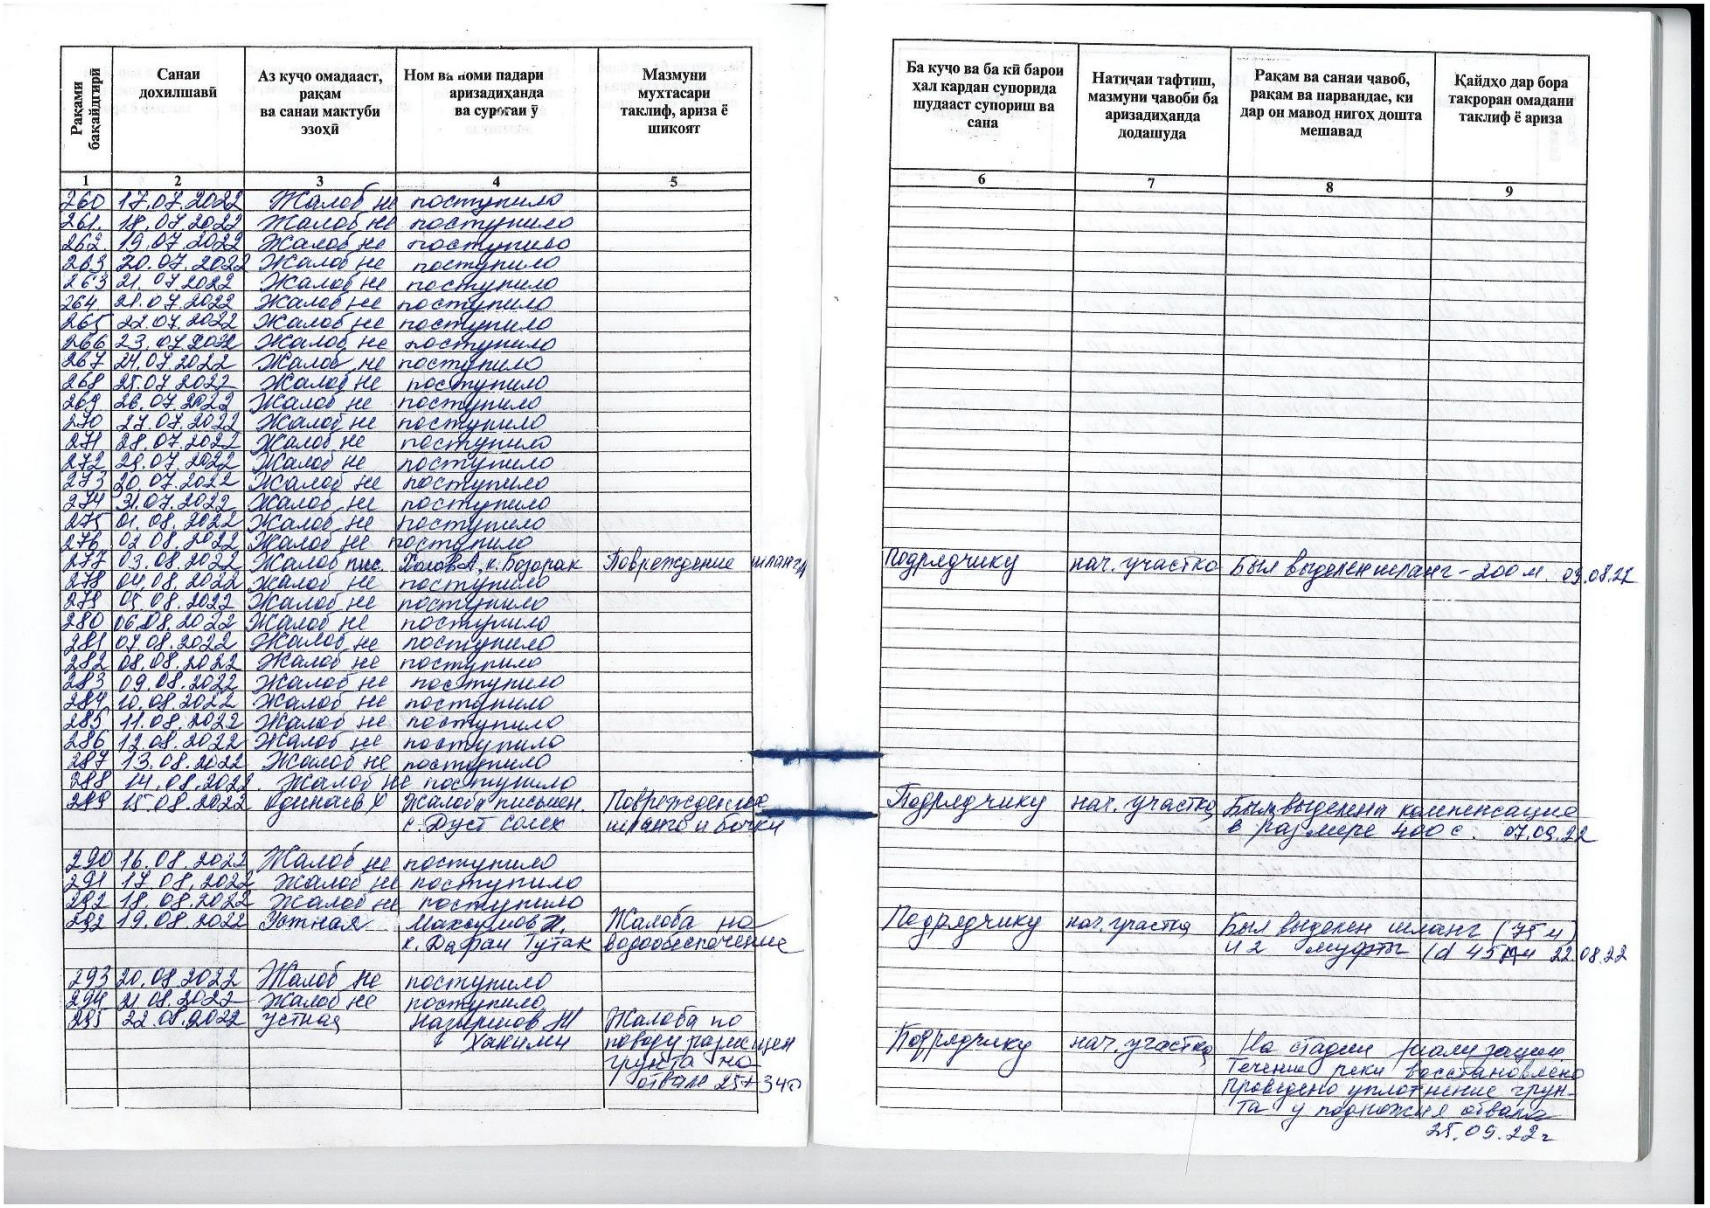

Рақами бақайдгирӣ	Санаи дохилшавӣ	Аз кучо омадааст, рақам ва санаи мактуби эзоҳӣ	Ном ва номи падари аризадиханда ва сурогаи ӯ	Мазмуни мухтасари таклиф, ариза ё шикоят	Ба кучо ва ба кӣ барои ҳал кардан супорида шудааст супориш ва сана	Натичаи тафтиш, мазмуни ҷавоби ба аризадиханда додашуда	Рақам ва санаи ҷавоб, рақам ва парвандае, ки дар он мавод нигоҳ дошта мешавад	Қайдҳо дар бора такроран омадани таклиф ё ариза
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	17.07.2022	Жалоб не	поступило					
261	18.07.2022	Жалоб не	поступило					
262	19.07.2022	Жалоб не	поступило					
263	20.07.2022	Жалоб не	поступило					
263	21.07.2022	Жалоб не	поступило					
264	21.07.2022	Жалоб не	поступило					
265	22.07.2022	Жалоб не	поступило					
266	23.07.2022	Жалоб не	поступило					
267	24.07.2022	Жалоб не	поступило					
268	25.07.2022	Жалоб не	поступило					
269	26.07.2022	Жалоб не	поступило					
270	27.07.2022	Жалоб не	поступило					
271	28.07.2022	Жалоб не	поступило					
272	28.07.2022	Жалоб не	поступило					
273	30.07.2022	Жалоб не	поступило					
274	31.07.2022	Жалоб не	поступило					
275	01.08.2022	Жалоб не	поступило					
276	02.08.2022	Жалоб не	поступило					
277	03.08.2022	Жалоб пис.	Гулова А. к. Бодрак	Повреждение шланга	Подрядчику	нач. участка	Был вручен шланг - 200 м. 09.08.22	
278	04.08.2022	Жалоб не	поступило					
279	05.08.2022	Жалоб не	поступило					
280	06.08.2022	Жалоб не	поступило					
281	07.08.2022	Жалоб не	поступило					
282	08.08.2022	Жалоб не	поступило					
283	09.08.2022	Жалоб не	поступило					
284	10.08.2022	Жалоб не	поступило					
285	11.08.2022	Жалоб не	поступило					
286	12.08.2022	Жалоб не	поступило					
287	13.08.2022	Жалоб не	поступило					
288	14.08.2022	Жалоб не	поступило					
289	15.08.2022	Усмонов У	Жалоба письмен. с. Дуст солих	Повреждение шланга и бочки	Подрядчику	нач. участка	Был вручена компенсация в размере 400 с. 07.08.22	
290	16.08.2022	Жалоб не	поступило					
291	17.08.2022	Жалоб не	поступило					
292	18.08.2022	Жалоб не	поступило					
292	19.08.2022	Устная	Махмудов Ж. с. Дафан Тутак	Жалоба на водообеспечение	Подрядчику	нач. участка	Был выдан шланг (75 м) и 2 муфт (d 45 мм 22.08.22	
293	20.08.2022	Жалоб не	поступило					
294	21.08.2022	Жалоб не	поступило					
295	22.08.2022	устная	Назаршоев М. с. Ханимон	Жалоба по поводу разлива грунта на обочине 25+340	Подрядчику	нач. участка	На старом русле реки Течение реки восстановлено Проверено уплотнение грунта у подпорной обочины 25.09.22г	

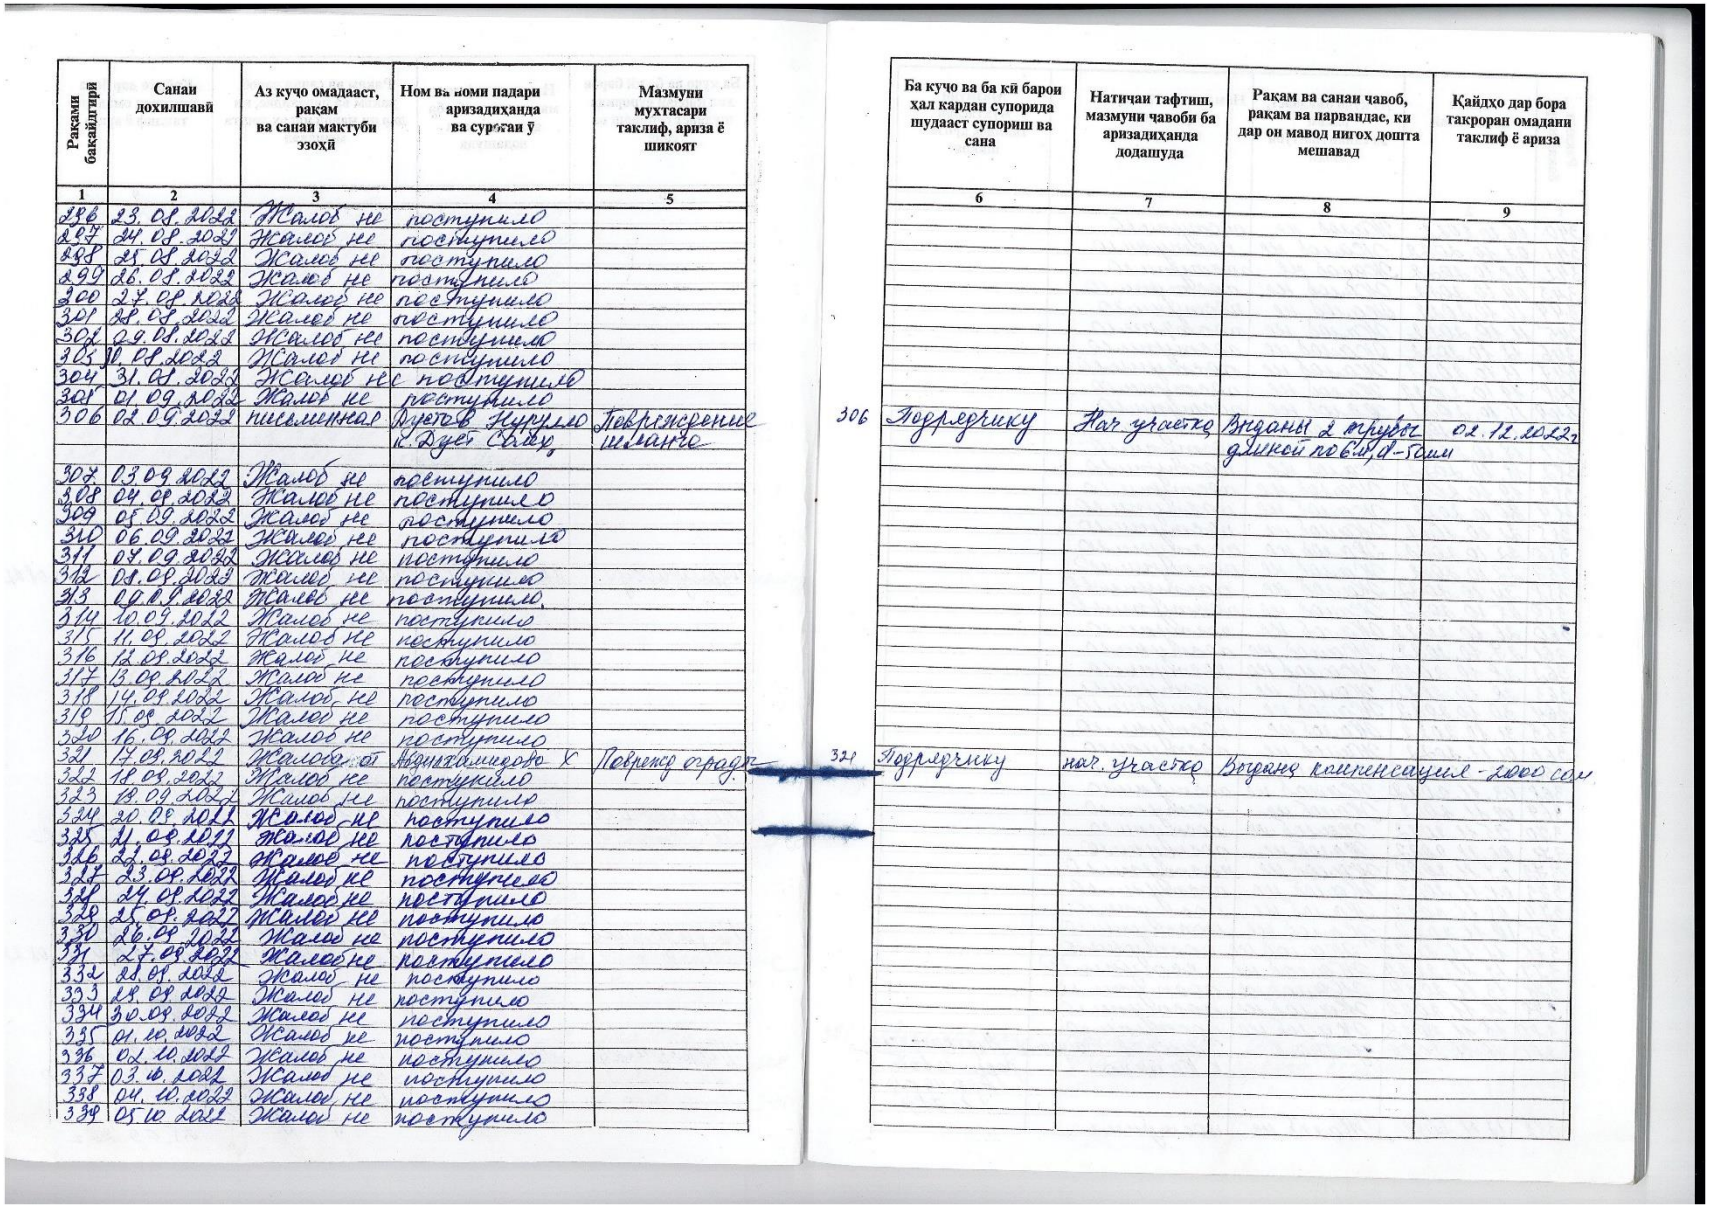

Рақами бақайдгирй	Санаи дохилшавй	Аз кучо омадааст, рақам ва санаи мактуби эзоҳй	Ном ва номи падари аризадиханда ва суроғаи ў	Мазмуни мухтасари таклиф, ариза ё шикоят	Ба кучо ва ба кй барои ҳал кардан супорида шудааст супориш ва сана	Натичаи тафтиш, мазмуни чавоби ба аризадиханда додашуда	Рақам ва санаи чавоб, рақам ва парвандае, ки дар он мавод нигох дошта мешавад	Қайдҳо дар бора такроран омадани таклиф ё ариза
1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	23.08.2022	Жалоб не	поступило					
287	24.08.2022	Жалоб не	поступило					
288	25.08.2022	Жалоб не	поступило					
289	26.08.2022	Жалоб не	поступило					
290	27.08.2022	Жалоб не	поступило					
291	28.08.2022	Жалоб не	поступило					
292	29.08.2022	Жалоб не	поступило					
293	30.08.2022	Жалоб не	поступило					
294	31.08.2022	Жалоб не	поступило					
295	01.09.2022	Жалоб не	поступило					
306	02.09.2022	письменная	Ергешов Нурулло г. Дүеъ Сохт,	Повреждение имения	306 Подрядчику	Нач. участка	Выданы 2 трубы длиной по 6,5 d-50мм	02.12.2022г
297	03.09.2022	Жалоб не	поступило					
298	04.09.2022	Жалоб не	поступило					
299	05.09.2022	Жалоб не	поступило					
310	06.09.2022	Жалоб не	поступило					
311	07.09.2022	Жалоб не	поступило					
312	08.09.2022	Жалоб не	поступило					
313	09.09.2022	Жалоб не	поступило.					
314	10.09.2022	Жалоб не	поступило					
315	11.09.2022	Жалоб не	поступило					
316	12.09.2022	Жалоб не	поступило					
317	13.09.2022	Жалоб не	поступило					
318	14.09.2022	Жалоб не	поступило					
319	15.09.2022	Жалоб не	поступило					
320	16.09.2022	Жалоб не	поступило					
321	17.09.2022	Жалоба от	Абдиҳамидова Х	Повреж ограж	321 Подрядчику	нач. участка	Выдана компенсация - 2000 сом	
322	18.09.2022	Жалоб не	поступило					
323	19.09.2022	Жалоб не	поступило					
324	20.09.2022	Жалоб не	поступило					
325	21.09.2022	Жалоб не	поступило					
326	22.09.2022	Жалоб не	поступило					
327	23.09.2022	Жалоб не	поступило					
328	24.09.2022	Жалоб не	поступило					
329	25.09.2022	Жалоб не	поступило					
330	26.09.2022	Жалоб не	поступило					
331	27.09.2022	Жалоб не	поступило					
332	28.09.2022	Жалоб не	поступило					
333	29.09.2022	Жалоб не	поступило					
334	30.09.2022	Жалоб не	поступило					
335	01.10.2022	Жалоб не	поступило					
336	02.10.2022	Жалоб не	поступило					
337	03.10.2022	Жалоб не	поступило					
338	04.10.2022	Жалоб не	поступило					
339	05.10.2022	Жалоб не	поступило					

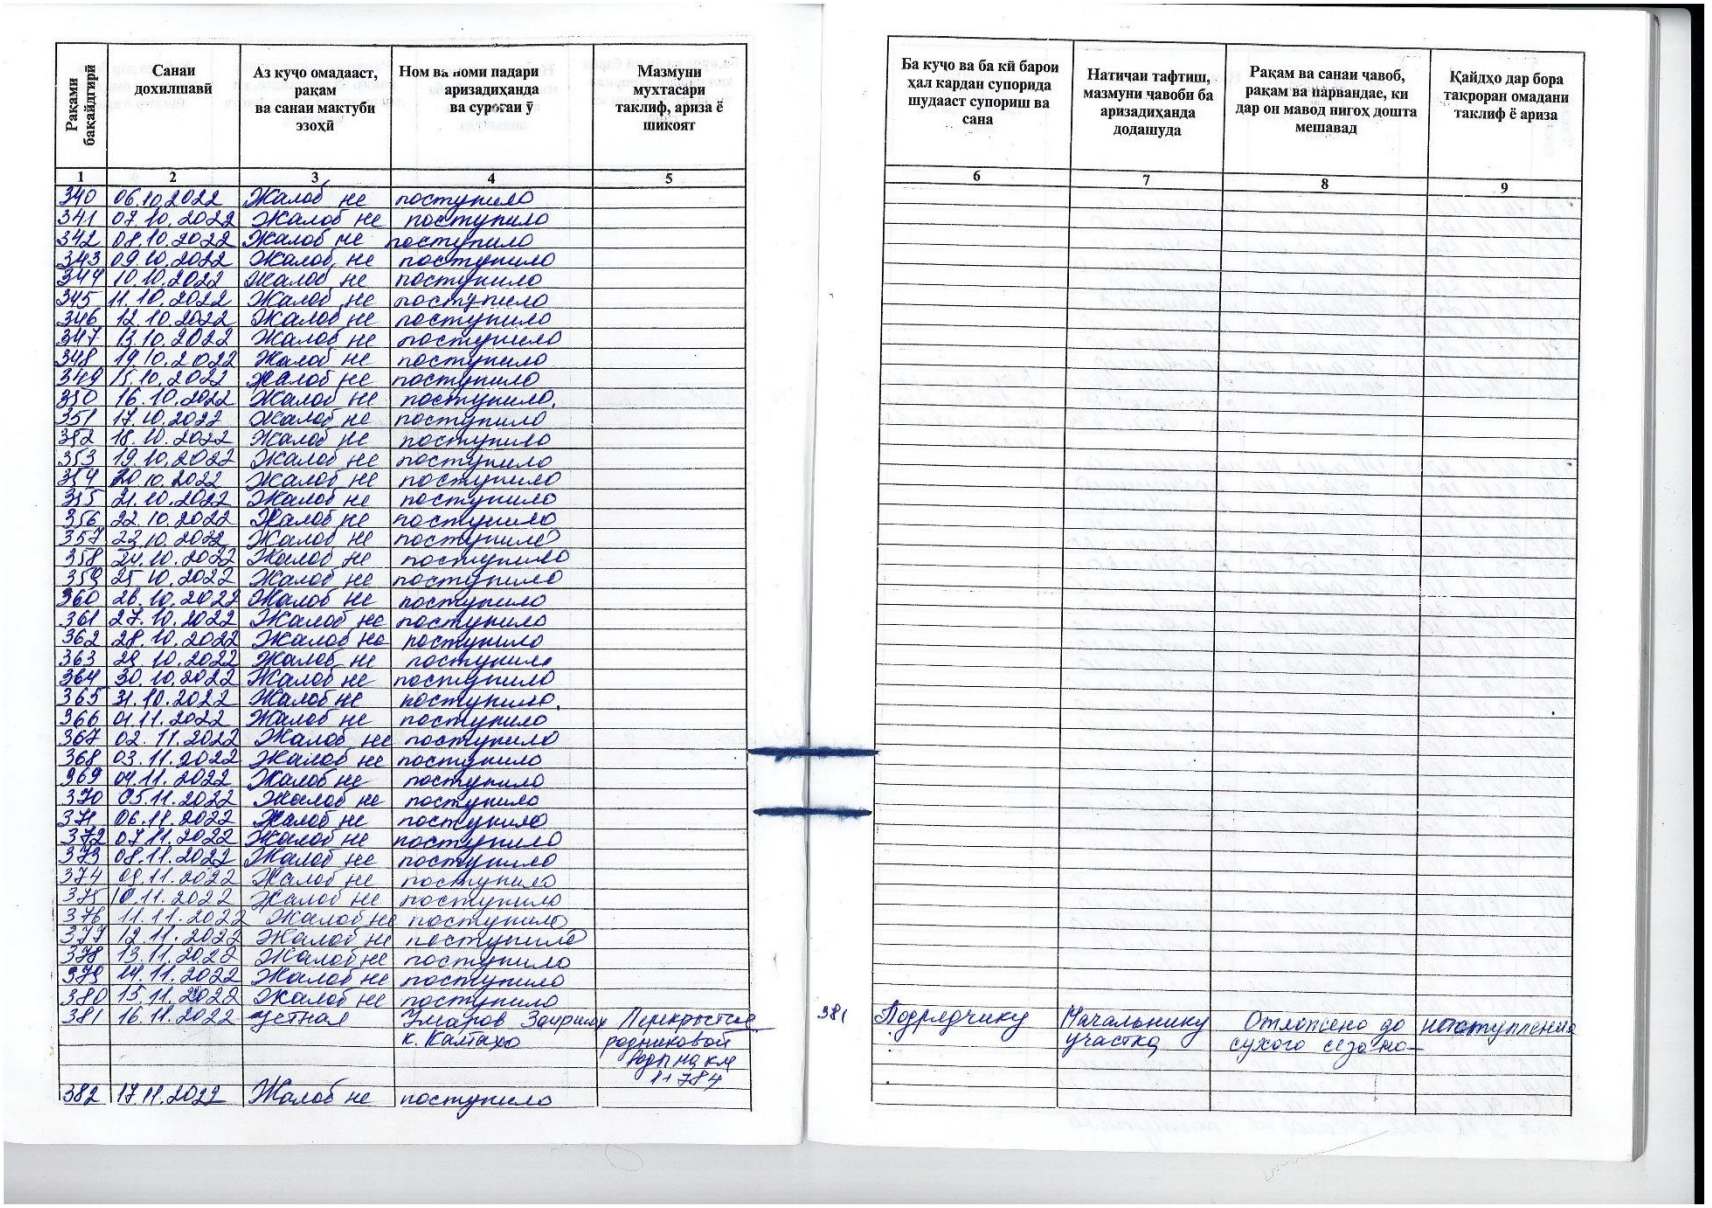

Рақами бақайдгирӣ	Санаи дохилшавӣ	Аз кучо омадааст, рақам ва санаи мактуби эзоҳӣ	Ном ва номи падари аризадиҳанда ва суроғаи ӯ	Мазмуни мухтасари таклиф, ариза ё шикоят
1	2	3	4	5
340	06.10.2022	Жалоб не	поступило	
341	07.10.2022	Жалоб не	поступило	
342	08.10.2022	Жалоб не	поступило	
343	09.10.2022	Жалоб не	поступило	
344	10.10.2022	Жалоб не	поступило	
345	11.10.2022	Жалоб не	поступило	
346	12.10.2022	Жалоб не	поступило	
347	13.10.2022	Жалоб не	поступило	
348	14.10.2022	Жалоб не	поступило	
349	15.10.2022	Жалоб не	поступило	
350	16.10.2022	Жалоб не	поступило.	
351	17.10.2022	Жалоб не	поступило	
352	18.10.2022	Жалоб не	поступило	
353	19.10.2022	Жалоб не	поступило	
354	20.10.2022	Жалоб не	поступило	
355	21.10.2022	Жалоб не	поступило	
356	22.10.2022	Жалоб не	поступило	
357	23.10.2022	Жалоб не	поступило	
358	24.10.2022	Жалоб не	поступило	
359	25.10.2022	Жалоб не	поступило	
360	26.10.2022	Жалоб не	поступило	
361	27.10.2022	Жалоб не	поступило	
362	28.10.2022	Жалоб не	поступило	
363	29.10.2022	Жалоб не	поступило	
364	30.10.2022	Жалоб не	поступило	
365	31.10.2022	Жалоб не	поступило.	
366	01.11.2022	Жалоб не	поступило	
367	02.11.2022	Жалоб не	поступило	
368	03.11.2022	Жалоб не	поступило	
369	04.11.2022	Жалоб не	поступило	
370	05.11.2022	Жалоб не	поступило	
371	06.11.2022	Жалоб не	поступило	
372	07.11.2022	Жалоб не	поступило	
373	08.11.2022	Жалоб не	поступило	
374	09.11.2022	Жалоб не	поступило	
375	10.11.2022	Жалоб не	поступило	
376	11.11.2022	Жалоб не	поступило	
377	12.11.2022	Жалоб не	поступило	
378	13.11.2022	Жалоб не	поступило	
379	14.11.2022	Жалоб не	поступило	
380	15.11.2022	Жалоб не	поступило	
381	16.11.2022	устная	Гиёзов Зафарджон к. Кайраҳо	Перекрестье родниковой трубы на км 21+784
382	17.11.2022	Жалоб не	поступило	

Ба кучо ва ба кӣ барои ҳал кардан супорида шудааст супориш ва сана	Натичаи тафтиш, мазмуни чавоби ба аризадиҳанда додашуда	Рақам ва санаи чавоб, рақам ва парвандае, ки дар он мавод нигоҳ дошта мешавад	Қайдҳо дар бора такроран омадани таклиф ё ариза
6	7	8	9
381 Подрядчику	Начальнику участка	Отлажено до сухого сезона	наступления

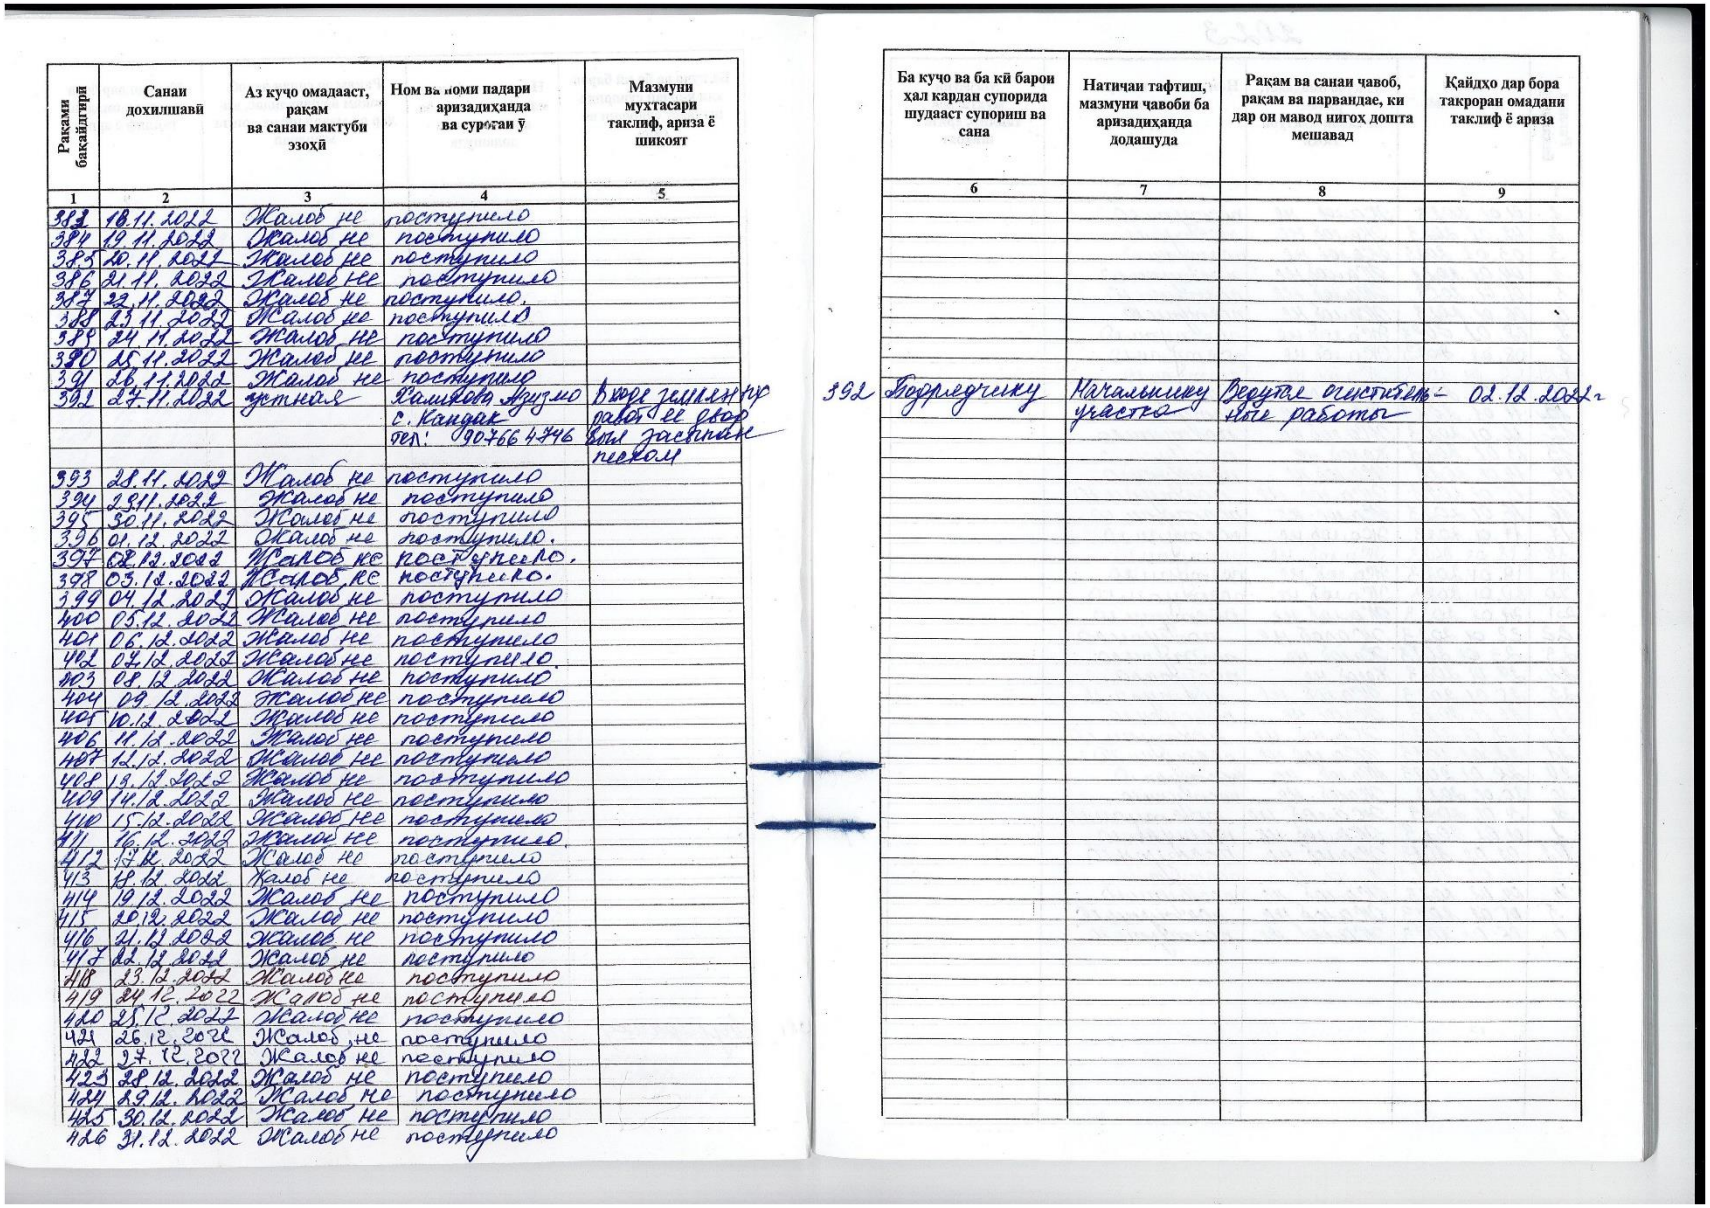

Рақами бақайдгирй	Санаи дохилшавй	Аз кучо омадааст, рақам ва санаи мактуби эзоҳй	Ном ва номи падари аризадиҳанда ва суроғаи ў	Мазмуни мухтасари таклиф, ариза ё шикоят	Ба кучо ва ба кй барои ҳал кардан супорида шудааст супориш ва сана	Натичаи тафтиш, мазмуни ҷавоби ба аризадиҳанда додашуда	Рақам ва санаи ҷавоб, рақам ва парвандае, ки дар он мавод нигоҳ дошта мешавад	Қайдҳо дар бора такроран омадани таклиф ё ариза
1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	18.11.2022	Жалоб не	поступило					
394	19.11.2022	Жалоб не	поступило					
395	20.11.2022	Жалоб не	поступило					
396	21.11.2022	Жалоб не	поступило					
397	22.11.2022	Жалоб не	поступило.					
398	23.11.2022	Жалоб не	поступило					
399	24.11.2022	Жалоб не	поступило					
390	25.11.2022	Жалоб не	поступило					
391	26.11.2022	Жалоб не	поступило					
392	27.11.2022	устная	Хамиева Арузмо с. Кандак тел: 907664746	Вдоре земельную работу ее двор Вам заставили пеклом	392 Бюрократику	Начальнику участка	Вернуле отчистительные работы	02.12.2022г
393	28.11.2022	Жалоб не	поступило					
394	29.11.2022	Жалоб не	поступило					
395	30.11.2022	Жалоб не	поступило					
396	01.12.2022	Жалоб не	поступило.					
397	02.12.2022	Жалоб не	поступило.					
398	03.12.2022	Жалоб не	поступило.					
399	04.12.2022	Жалоб не	поступило					
400	05.12.2022	Жалоб не	поступило					
401	06.12.2022	Жалоб не	поступило					
402	07.12.2022	Жалоб не	поступило.					
403	08.12.2022	Жалоб не	поступило					
404	09.12.2022	Жалоб не	поступило					
405	10.12.2022	Жалоб не	поступило					
406	11.12.2022	Жалоб не	поступило					
407	12.12.2022	Жалоб не	поступило					
408	13.12.2022	Жалоб не	поступило					
409	14.12.2022	Жалоб не	поступило					
410	15.12.2022	Жалоб не	поступило					
411	16.12.2022	Жалоб не	поступило.					
412	17.12.2022	Жалоб не	поступило					
413	18.12.2022	Жалоб не	поступило					
414	19.12.2022	Жалоб не	поступило					
415	20.12.2022	Жалоб не	поступило					
416	21.12.2022	Жалоб не	поступило					
417	22.12.2022	Жалоб не	поступило					
418	23.12.2022	Жалоб не	поступило					
419	24.12.2022	Жалоб не	поступило					
420	25.12.2022	Жалоб не	поступило					
421	26.12.2022	Жалоб не	поступило					
422	27.12.2022	Жалоб не	поступило					
423	28.12.2022	Жалоб не	поступило					
424	29.12.2022	Жалоб не	поступило					
425	30.12.2022	Жалоб не	поступило					
426	31.12.2022	Жалоб не	поступило					
